DURA VERMEER
Dura Vermeer Infra Regio Noord West
Postbus 228
2100 AE Heemstede

Realisatieplanning GO Langedijk

Opdrachtgever: Gemeente Langedijk
Projectnummer: 45192768

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
0	**Realisatieplanning GO Langedijk**	**189 dagen**	**maa 16-09-1**	**maa 29-06-2**	
1	**Westelijke Randweg Oudkarspel (vak 1)**	**179,75 dag**	**maa 16-09-1**	**din 16-06-20**	
23	**De Vork Oudkarspel (vak 2)**	**7 dagen**	**woe 17-06-2**	**don 25-06-20**	
24	Plaatsen afzetting	0,1 uur	woe 17-06-2	woe 17-06-2	233GB-4 dagen
25	Afsteken bermen	1 dag	woe 17-06-2	woe 17-06-2	24GB
26	Verw. Elementenverhardingen	0,25 dagen	woe 17-06-2	woe 17-06-2	25GB
27	Frezen thermoplasten	0,5 dagen	woe 17-06-2	woe 17-06-2	26
28	Profielfrezen	1 dag	don 18-06-2	don 18-06-2	27BE+0,25 dagen
29	Frezen bakken	0,5 dagen	vri 19-06-20	vri 19-06-20	28
30	Zagen t.b.v. grasbetontegels	0,5 dagen	vri 19-06-20	vri 19-06-20	28
31	Opbreken t.b.v. grasbetontegels	0,5 dagen	vri 19-06-20	vri 19-06-20	30
32	Ontgraven cunet	0,25 dagen	maa 22-06-2	maa 22-06-2	31
33	Aanbrengen fundatie	0,25 dagen	maa 22-06-2	maa 22-06-2	32
34	Profileren fundatie	0,5 dagen	maa 22-06-2	maa 22-06-2	33
35	**Aanbr. Elementen verhardingen**	**1 dag**	**din 23-06-20**	**din 23-06-20**	**34**
37	Aanbr. Asfalt bakinlage	0,1 dagen	woe 24-06-2	woe 24-06-2	35
38	Aanbr. Asfalt tussenlaag	0,2 dagen	woe 24-06-2	woe 24-06-2	37
39	Aanbr. Asfalt deklaag	0,2 dagen	woe 24-06-2	woe 24-06-2	38
40	Aanbr. Thermoplasten	0,5 dagen	don 25-06-2	don 25-06-2	39BE+0,5 dagen
41	Aanbr. Grond in grasbetontegel	1 dag	don 25-06-2	don 25-06-2	40GB
42	Verw. Afzettingen	0 dagen	don 25-06-2	don 25-06-2	41
43	~~Voorburggracht deel 1 Zuid Scharwoude (vak 3)~~	~~12,5 dagen~~	~~maa 16-09-1~~	~~woe 02-10-1~~	
60	~~Voorburggracht deel 2 Zuid Scharwoude (vak 4)~~	~~14,5 dagen~~	~~maa 16-09-1~~	~~vri 04-10-19~~	
79	**Voorburggracht deel 3 Broek op Langedijk (vak 5)**	**12,5 dagen**	**maa 16-09-1**	**woe 02-10-1**	
98	~~Pieter Zeemanweg Zuid Scharwoude (vak 6)~~	~~1,5 dagen~~	~~din 14-04-20~~	~~woe 15-04-2~~	
103	~~De Swaan Zuid Scharwoude (vak 7)~~	~~7 dagen~~	~~din 07-04-20~~	~~don 16-04-2~~	
116	**Karper Zuid Scharwoude (vak 9)**	**15 dagen**	**maa 16-09-1**	**vri 04-10-19**	
132	~~Wulp Zuid Scharwoude (vak 10)~~	~~5,25 dagen~~	~~woe 20-11-1~~	~~woe 27-11-1~~	
142	~~Waterral Broek op Langedijk (vak 11)~~	~~9 dagen~~	~~don 16-04-2~~	~~don 30-04-2~~	
154	~~Reiger Broek op Langedijk (vak 12)~~	~~6 dagen~~	~~woe 20-11-1~~	~~woe 27-11-1~~	
164	~~Meeuw Broek op Langedijk (vak 13)~~	~~9 dagen~~	~~don 16-04-2~~	~~don 30-04-2~~	
176	**Middelmoot Broek op Langedijk (vak 14)**	**187 dagen**	**maa 16-09-1**	**don 25-06-20**	
188	**Kruissloot Sint Pancras/Alkmaar (vak 15)**	**27 dagen?**	**woe 06-05-2**	**din 16-06-20**	
189	**Fase 1A**	**18 dagen**	**woe 06-05-2**	**woe 03-06-2**	
190	Plaatsen afzetting	0 dagen	woe 06-05-2	woe 06-05-2	
191	Afsteken bermen	1 dag	woe 06-05-2	woe 06-05-2	190GB
192	Verw. Elementenverhardingen	2 dagen	woe 06-05-2	don 07-05-2	191GB
193	Ontgraven cunet	4 dagen	don 07-05-2	din 12-05-20	192GB+1 dag
194	Profileren zand	4 dagen	vri 08-05-20	woe 13-05-2	193GB+1 dag
195	Aanbr. fundatie	4 dagen	vri 08-05-20	woe 13-05-2	194GB
196	**Aanbr. Elementen verhardingen**	**10 dagen**	**woe 13-05-2**	**don 28-05-2**	
197	Aanbr. Banden	5 dagen	woe 13-05-2	din 19-05-20	195GB+3 dagen
198	Aanbr. Gootlaag	1,5 dagen	maa 18-05-2	din 19-05-20	197GE
199	Aanhelen voetpad bestrating	5 dagen	woe 20-05-2	don 28-05-2	198
200	Profileren fundatie	1 dag	woe 20-05-2	woe 20-05-2	199GB
201	Aanbr. Asfalt onderlaag 1 FP/80 Stab22	0,4 dagen	woe 03-06-2	woe 03-06-2	199
202	Aanbr. Asfalt onderlaag 2 FP/ 50 Stab 16	0,2 dagen	woe 03-06-2	woe 03-06-2	201
203	Aanbr. Asfalt deklaag FP/30 DAB11	0,4 dagen	woe 03-06-2	woe 03-06-2	202;220
204	**Fase 1B**	**6,4 dagen**	**don 04-06-2**	**vri 12-06-20**	
205	Verplaatsen afzetting	0,2 dagen	don 04-06-2	don 04-06-2	203
206	Afsteken bermen	1 dag	don 04-06-2	don 04-06-2	205GB
207	Verw. Elementenverhardingen	1 dag	don 04-06-2	don 04-06-2	206GB
208	Ontgraven cunet	2 dagen	vri 05-06-20	maa 08-06-2	207
209	Profileren zand	2 dagen	vri 05-06-20	maa 08-06-2	208GB
210	Aanbr. fundatie	2 dagen	maa 08-06-2	din 09-06-20	209GB+1 dag
211	Aanbr. Elementen verhardingen	2 dagen	woe 10-06-2	don 11-06-2	210
212	Profileren fundatie	0,5 dagen	don 11-06-2	don 11-06-2	211GE
213	Aanbr. Asfalt onderlaag 1 FP	0,2 dagen	vri 12-06-20	vri 12-06-20	227
214	Aanbr. Asfalt deklaag FP	0,2 dagen	vri 12-06-20	vri 12-06-20	213
215	**Rijbaan**	**21 dagen?**	**don 14-05-2**	**din 16-06-20**	
216	Frezen thermoplasten	0,5 dagen	don 14-05-2	don 14-05-2	195
217	Verw. Cretеprint	0,5 dagen	don 14-05-2	don 14-05-2	216
218	Aanbrengen eiland	0,5 dagen	vri 15-05-20	vri 15-05-20	217
219	Aanbr. Asfalt onderlaag (cretеprint) 80 Stab22	0,2 dagen	woe 03-06-2	woe 03-06-2	201GB
220	Aanbr. Asfalt onderlaag (cretеprint)50 Stab 16	0,2 dagen	woe 03-06-2	woe 03-06-2	219;202GB
221	Zagen en herstellen gootlagen	1,5 dagen	vri 15-05-20	maa 18-05-2	218
222	Profielfrezen	0,7 dagen	din 19-05-20	din 19-05-20	221
223	Frezen drempels	0,3 dagen	din 19-05-20	din 19-05-20	222
224	Frezen bakken	0 dagen?	din 19-05-20	din 19-05-20	223
225	Aanbrengen plakbanden	0,3 dagen	din 09-06-20	din 09-06-20	208
226	Voorb. Asfalt drempels	0,5 dagen	woe 10-06-2	woe 10-06-2	210
227	Aanbr. Asfaltbakken	0 dagen?	don 11-06-2	don 11-06-2	212
228	Uitvulling drempels	0,2 dagen	vri 12-06-20	vri 12-06-20	214
229	Aanbr. Asfalt deklaag RB	0,4 dagen	vri 12-06-20	vri 12-06-20	228
230	Aanbr. Thermoplasten	1 dag	maa 15-06-2	maa 15-06-2	229
231	Afwerken en inzaaien bermen	1 dag	din 16-06-20	din 16-06-20	230
232	Verw. Afzettingen	0 dagen	din 16-06-20	din 16-06-20	231
233	**Fase 2 Kruising Ged. Veert**	**5 dagen**	**din 23-06-20**	**maa 29-06-2**	
234	Verplaatsen afzetting	0,1 dagen	din 23-06-20	din 23-06-20	231BE+4 dagen
235	Aanbrengen omleidingroute (hek verw. Boer)	1 dag	din 23-06-20	din 23-06-20	234GB
236	Afsteken bermen	0,5 dagen	din 23-06-20	din 23-06-20	235GE
237	Verw. Thermoplast	0,5 dagen	woe 24-06-2	woe 24-06-2	236
238	Profielfrezen kruising (30mm)	0,5 dagen	woe 24-06-2	woe 24-06-2	237GB
239	Aanbr. Asfalt deklaag rijbaan	0,5 dagen	woe 24-06-2	woe 24-06-2	238
240	Aanbrengen coating	1,5 dagen	don 25-06-2	vri 26-06-20	239
241	Uithardingstijd	0,5 dagen	vri 26-06-20	vri 26-06-20	240
242	Aanbrengen thermoplast	0,5 dagen	maa 29-06-2	maa 29-06-2	241
243	Verwijderen omleidingsroute	0,4 dagen	maa 29-06-2	maa 29-06-2	242
244	Verwijderen afzetting	0,1 dagen	maa 29-06-2	maa 29-06-2	243

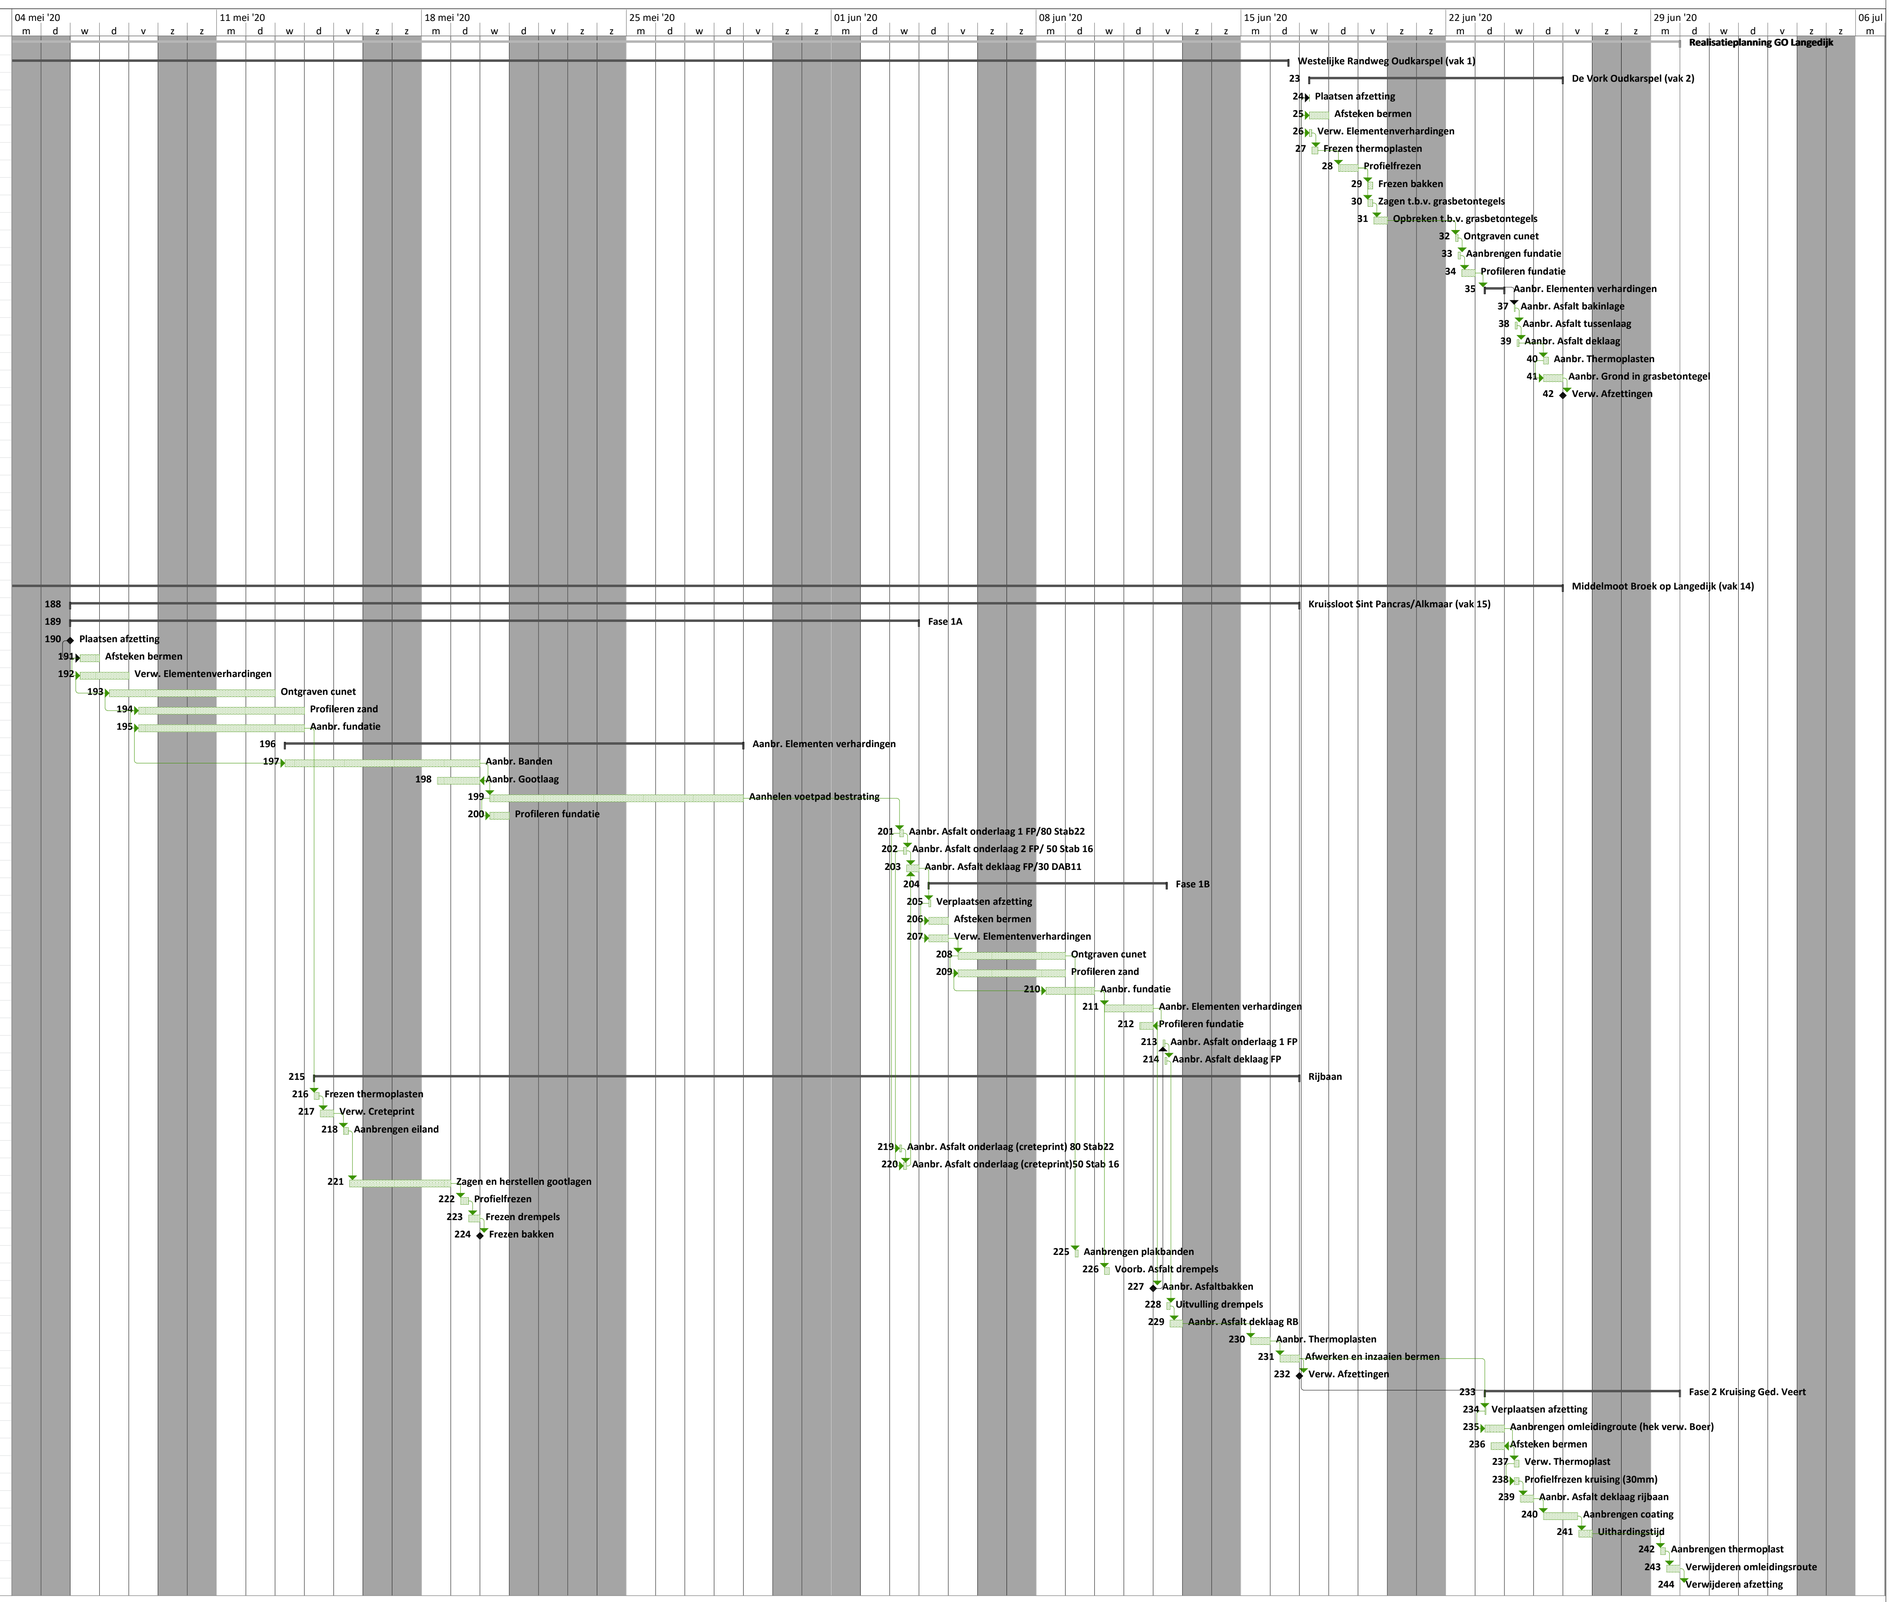

Versie: E
Door: PKO/SBO
Datum: 01-05-2020

CONCEPT/DEFINITIEF
